

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

.....

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N° 69
del 18 OTT. 2016

OGGETTO

Lavori urgenti di messa in
sicurezza dell'adduttore
Castello -

CUP: G73J13000530002-
CIG: 541629218E -

D.D.G. n° 858 del
06/08/2013 -

Perizia suppletiva e di
variante 06/07/2016 -

Presa d'atto -

L'anno **duemilasedici**, il giorno 18 OTTOBRE del
mese di OTTOBRE, presso la Sede
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica
Utilità, sita in Palermo, Viale Campania, 36/a-c;

L'Ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del Consorzio
suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 55 /**Gab.**
del 04/08/2016, con l'assistenza del Direttore Generale
Ing. Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione n° 31 del 26/11/1997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, come successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 168 del 22/23 luglio
2008, con deliberazione n° 75 del 29/09/2008;

VISTA la nota prot. n° 115230 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 458 del 13/11/2009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere n° 75 del 29/09/2008 e n° 81 del 15/10/2008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n° 92/S.6/S.G. del 29/02/2012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n° 168 del 22/23 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla
stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali
dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestione ordinaria
dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.A. n° 55/Gab. del 04/08/2016 con il quale l'Ing. Francesco Greco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.7 dello Statuto consorziale;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'Esercizio in Corso, approvato da questo Consorzio con deliberazione n° 28 del 09/05/2016 e dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n° 950 - Servizio 4 del 03/08/2016;

VISTO il provvedimento prot. n° 687/688 del 26/01/2015 con il quale sono state conferite all'Ing. Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore Generale di questo Consorzio;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Leg. vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n° 207/2010;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12, con la quale la Regione Siciliana ha recepito il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture);

VISTO il Reg.to di esecuzione ed attuazione della predetta L.R. n. 12/2011, emanato con D. Pres. 31/01/2012, n. 13;

VISTO il progetto esecutivo dei *Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Castello*, redatto dall'Assessorato Regionale dell'Energia - Dipartimento Regionale dell'Acqua – in data Marzo 2013, dell'importo complessivo di € 1.155.000,00, secondo il seguente quadro economico:

a) Lavori		
a.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 576 051,78
a.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21 504,20
a.3	Manodopera non soggetta a ribasso	€ 131 274,89
Totale lavori		€ 728 830,87
b) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1.1	Lavori in economia	€ 13 000,00
b.1.2	Oneri accesso discarica	€ 50 000,00
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 24 000,00
b.4	Imprevisti in arrotondamento	4,8% di a) € 34 811,33
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi con spese e procedure	€ 18 000,00
b.6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice	1,0% di a) € 7 288,31
b.7.1	Spese di cui all'art. 90 comma 5 del Codice	€ 3 000,00
b.7.2	Spese di cui all'art. 92 comma 7 bis del Codice	€ 40 000,00
b.7.3	Assistenza giornaliera di cui all'art. 16 comma 1 punto 7 del DPR 207/2010	1,5% di a) € 10 932,46
b.7.4	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del codice	2,0% di a) € 14 576,62
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	€ 0,00
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 1 000,00
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 15 000,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 1 500,00
b.12.1	Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€ 400,00
b.12.2	I.v.a. su: a)+b.1.1)+b.1.2)+b.3)+b.4)+b.6)+b.7.1)+b.7.2)+b.10)+b.11)	21,0% € 192 660,41
Totale somme a disposizione		€ 426 169,13
TOTALE a) + b)		€ 1 155 000,00

VISTA la convenzione stipulata il 19 aprile 2013 tra Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Reg.le per gli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e questo Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, con il quale, si è stabilito che le “somme a disposizione dell'Amministrazione saranno trasferite dal Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari al Consorzio di Bonifica III – Agrigento, il quale avrà la funzione di stazione appaltante dei lavori” e che “per dare continuità all'azione tecnico-amministrativa saranno mantenuti vivi gli incarichi già conferiti dal Dirigente del Servizio III del

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con D.D.S. n° 99 del 05.02.2013 ove sono state individuate le figure di Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore Operativo, Assistente alla Progettazione, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Collaboratore amministrativo alla Progettazione ed alla Direzione dei Lavori e di Supporto al Responsabile del Procedimento”;

VISTO di D.D.G. n° 858 del 06/08/2013 con il quale l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha finanziato il progetto di che trattasi confermando il superiore Quadro Economico ed ha individuato questa Amministrazione quale “Stazione Appaltante”;

VISTA la nota prot. n° 39267 del 09/10/2013, con cui l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 3 Gestione Infrastrutture per le Acque ha trasmesso il D.D.S. n° 99 del 05/02/2013 con il quale, tra l'altro, l'Ing. Achille Furioso è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 57 del 23/12/2013 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati lo schema di bando integrale, il disciplinare di gara e lo schema di bando da pubblicare sulla GURS ed è stata autorizzata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in oggetto, seguendo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 comma 1, lettera a) della L.R. 12/2011 con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA Deliberazione del Commissario Straordinario n° 56 del 30/10/2014 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in argomento in favore dell'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. – Via Cesare Battisti, 73 98122 MESSINA – Part. IVA 02122600832, che ha offerto il ribasso del 33,6465;

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 33,6465 % offerto dall'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L., risulta definito secondo il seguente prospetto:

A)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 576.051,78
B)	A detrarre il ribasso d'asta del 33,6465 %	€ 193.821,26
C)	Importo netto dei lavori	€ 382.230,52
D)	Spese relative al costo del personale <i>non soggette a ribasso</i>	€ 131.274,89
E)	Oneri della sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>	€ 21.504,20
Totale importo dei lavori		€ 535.009,61
F)	IVA 22 % su importo dei lavori	€ 117.702,11
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€ 665.711,72

ed a seguito dell'intervenuto incremento dell'I.V.A. dal 21% al 22% il quadro economico di progetto risulta come di seguito riportato:

a) Lavori		
a.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 576 051,78
	<i>Ribasso d'asta</i> 33,6465% di a.1)	-€ 193 821,26
a.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21 504,20
a.3	Manodopera non soggetta a ribasso	€ 131 274,89
Totale lavori		€ 535 009,61 -€ 193 821,26
b) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1.1	Lavori in economia	€ 13 000,00
b.1.2	Oneri accesso discarica	€ 50 000,00
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 24 000,00
b.4	Imprevisti in arrotondamento	€ 28 880,11 -€ 5 931,22
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi con spese e procedure	€ 18 000,00
b.6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice	€ 7 288,31

b.7.1	Spese di cui all'art. 90 comma 5 del Codice		€ 3 000,00	
b.7.2	Spese di cui all'art. 92 comma 7 bis del Codice		€ 40 000,00	
b.7.3	Assistenza giornaliera di cui all'art. 16 comma 1 punto 7 del DPR 207/2010		€ 10 932,46	
b.7.4	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del codice		€ 14 576,62	
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione		€ 0,00	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici		€ 1 000,00	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 15 000,00	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		€ 1 500,00	
b.12.1	Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05		€ 400,00	
b.12.2	I.v.a. su: a)+b.1.1)+b.1.2)+b.3)+b.4)+b.6)+b.7.1)+b.7.2)+b.10)+b.11)	22,0%	€ 157 889,17	-€ 34 771,24
Totale somme a disposizione			€ 385 466,67	-€ 40 702,46
c) Economie a seguito ribasso d'asta				
c.1	Ribasso d'asta		€ 193 821,26	
	I.v.a. su: c.1)	21,0%	€ 40 702,46	
Totale economie a seguito ribasso d'asta			€ 234 523,72	
TOTALE a) + b) + c)			€ 1 155 000,00	

CHE con verbale del 02/12/2014 si è dato atto del permanere delle condizioni che consentivano l'immediata esecuzione dei lavori e, quindi, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 106 – comma 1- del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207;

CHE con Verbale del 02/12/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'Art. 11. – comma 9 – del Codice dei Contratti e dell'art. 154 del Regolamento n. 207/2010;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. in data 10/02/2015 è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20/02/2015 al n. 339 – Serie 3;

VISTA la nota prot. n. 593 del 09/02/2015 con la quale è stato trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento il progetto strutturale dei lavori in argomento ed è stata richiesta l'autorizzazione ex art. 18 della Legge n°64 del 02/02/1974 - D.M. 16/01/1996;

VISTO il verbale del 02/02/2015 con il quale, per le motivazioni nello stesso indicate, è stata disposta la sospensione dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 52677 del 26/03/2015 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha rilasciato l'autorizzazione prot. n° 63949 (ex art. 18 della Legge n°64 del 02/02/1974 - D.M. 16/01/1996) all'esecuzione dei lavori con le prescrizioni e raccomandazioni nello stesso indicate;

VISTO il verbale datato 13/04/2015 con il quale, essendo cessate le cause che avevano originato la sospensione del 02/02/2015, la D.L. ha proceduto alla ripresa dei lavori;

VISTO il provvedimento prot. 3850 del 20/07/2015 con il quale il RUP, in accoglimento di apposita istanza formulata dall'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L., ha concesso una proroga di giorni 90 (novanta) del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, traslando la stessa per il 08/10/2015;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori datato 11/08/2015 e la successiva ripresa intervenuta con verbale redatto il 16/11/2015;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare alle superiori prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento nonché della necessità di variare gli importi previsti in alcune voci del quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è stato necessario predisporre apposita perizia di

variante per rimodulazione del quadro economico, redatta dal direttore dei lavori il 16/12/2015, alla quale si rimanda per ogni utile approfondimento;

VISTA la suddetta perizia di variante per rimodulazione del quadro economico dei *Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Castello*, datata 16/12/2015, dell'importo complessivo invariato di € 1.155.000,00, rispetto a quanto complessivamente assentito, secondo il seguente quadro economico:

a) Lavori			
a.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 576 051,78	
	<i>Ribasso d'asta</i> 33,6465% di a.1)	-€ 193 821,26	
a.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21 504,20	
a.3	Manodopera non soggetta a ribasso	€ 131 274,89	
	Totale lavori	€ 535 009,61	-€ 193 821,26
b) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b.1.1	Lavori in economia	€ 34 470,00	€ 21 470,00
b.1.2	Oneri accesso discarica	€ 15 000,00	-€ 35 000,00
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	-€ 24 000,00
b.4	Imprevisti in arrotondamento	€ 28 880,11	-€ 5 931,22
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi con spese e procedure	€ 18 000,00	
b.6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice	€ 0,00	-€ 7 288,31
b.7.1	Spese di cui all'art. 90 comma 5 del Codice	€ 0,00	-€ 3 000,00
b.7.2	Spese di cui all'art. 92 comma 7 bis del Codice	€ 50 468,66	€ 10 468,66
b.7.3	Assistenza giornaliera di cui all'art. 16 comma 1 punto 7 del DPR 207/2010	€ 19 454,63	€ 8 522,17
b.7.4	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del codice	€ 14 576,62	
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	€ 0,00	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 2 068,08	€ 1 068,08
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 3 508,89	-€ 11 491,11
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 5 200,00	€ 3 700,00
b.12.1	Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€ 400,00	
b.12.2	I.v.a. su: a)+b.1.1)+b.1.2)+b.3)+b.4)+b.6)+b.7.1)+b.7.2)+b.10)+b.11)	22,0%	€ 147 958,20 -€ 44 702,21
	Totale somme a disposizione	€ 339 985,19	-€ 86 183,94
c) Economie a seguito ribasso d'asta			
c.1	Ribasso d'asta	€ 193 821,26	
	I.v.a. su: c.1)	21,0%	€ 40 702,46
	Totale economie a seguito ribasso d'asta	€ 234 523,72	
d) Altre economie			
d.1	Economie su lavori	€ 0,00	
d.2	Economie su somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 45 481,48	
	Totale altre economie	€ 45 481,48	
	TOTALE a) + b) + c) + d)	€ 1 155 000,00	

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 02 del 21/01/2016 con la quale è stata approvata la sopra detta perizia di variante per rimodulazione del quadro economico, datata 16/12/2015, dell'importo complessivo invariato di € 1.155.000,00, confermando il superiore quadro economico;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è stata ravvisata la necessità, ai sensi del comma 3, secondo periodo dell'art. 132 del D. Lgs. n°163 del 12/04/2016 e ss.mm.ii., di apportare alcune modifiche nella conformazione, disposizione e tipologia di alcune parti delle opere in progetto al fine di adattarle alla reale situazione dei luoghi ed alle prescrizioni imposte dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento e che tali modifiche sono state condotte nell'ambito della discrezionalità dell'operato della Direzione Lavori con l'emissione di ordini di servizio, come previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, previa autorizzazione specifica del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO che quanto sopra ha reso necessario la predisposizione di apposita perizia suppletiva e di variante;

VISTA la perizia suppletiva e di variante dei *Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Castello*, datata 06/07/2016, dell'importo complessivo invariato di € 1.155.000,00, rispetto a quanto complessivamente assentito con il D.A. di finanziamento, secondo il seguente quadro economico:

a) Lavori			
a.1.1	Lavori a misura	€ 565.035,04	-€ 11.016,74
a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00	
a.1.3	Lavori in economia	€ 11.152,54	€ 11.152,54
<i>Ribasso d'asta complessivo (su lavori a misura e in economia)</i>		33,6465% di a.1)	-€ 193 866,96
a.2 + a.3	Costi sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso	€ 170 902,96	
Totale lavori		€ 553 223,59	€ 18 213,98
b) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b.1.1	Lavori in economia	€ 34 470,00	
b.1.2	Oneri accesso discarica	€ 15 000,00	
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
b.4	Imprevisti in arrotondamento	€ 10 366,79	-€ 18 513,32
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi con spese e procedure	€ 18 000,00	
b.6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice	€ 0,00	
b.7.1	Spese di cui all'art. 90 comma 5 del Codice	€ 0,00	
b.7.2	Spese di cui all'art. 92 comma 7 bis del Codice	€ 50 468,66	
b.7.3	Assistenza giornaliera di cui all'art. 16 comma 1 punto 7 del DPR 207/2010	€ 19 454,63	
b.7.4	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del codice	€ 14 941,81	€ 365,19
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	€ 0,00	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 2 068,08	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 3 508,89	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 5 200,00	
b.12.1	Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€ 400,00	
b.12.2	I.v.a. su: a)+b.1.1)+b.1.2)+b.3)+b.4)+b.6)+b.7.1)+b.7.2)+b.10)+b.11)	22,0%	€ 147 892,35 -€ 65,85
Totale somme a disposizione		€ 327 869,26	-€ 18 213,98
c) Economie a seguito ribasso d'asta			
c.1	Ribasso d'asta	€ 193 821,26	
	I.v.a. su: c.1)	21,0%	€ 40 702,46
Totale economie a seguito ribasso d'asta		€ 234 523,72	
d) Altre economie			
d.1	Economie su lavori	€ 0,00	
d.2	Economie su somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 45 481,48	
Totale altre economie		€ 45 481,48	
TOTALE a) + b) + c) + d)		€ 1 155 000,00	

VISTO il Parere del 29/09/2016 con il quale dell'Ing. Achille Furioso, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, ha ritenuto meritevole di approvazione in linea tecnica la perizia di variante per rimodulazione del quadro economico dei lavori in oggetto, redatta dal D. L. in pari data, confermando il quadro economico sopra riportato;

CONSIDERATO che la perizia in argomento è costituita dai seguenti allegati:

1. Relazione
2. Computo metrico estimativo
3. Quadro comparativo
4. Schema atto di sottomissione

CONSIDERATO che, come meglio può evincersi dagli elaborati allegati alla suddetta perizia, le variazioni delle lavorazioni previste in progetto hanno determinato un incremento dell'importo, rispetto al contratto principale, di € 18.213,98, oltre il conseguente aumento dell'I.V.A. e delle spese di cui all'art. 92 comma 5 del Codice e che detto importo troverà copertura nell'ambito delle voci b.4 (Imprevisti) e b.12.2 (I.V.A.) della Perizia per rimodulazione del Q. E., approvata con Deliberazione n° 02/2016;

CONSIDERATO che per la regolarizzazione dei rapporti con l'impresa è stato redatto apposito Schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dalla stessa senza riserva, nel quale si prevede la predetta maggiore spesa, rispetto al contratto principale, di netti € 18.213,98, oltre I.V.A. al 22%;

CONSIDERATO che occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo per prendere atto della sopra richiamata perizia suppletiva e di variante datata 06/07/2016;

VISTA la proposta per l'adozione della presente delibera, predisposta in data 17/10/2016 dall'Ing. Achille Furioso, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento, che costituisce parte integrante del presente atto amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

- prendere atto della perizia suppletiva e di variante dei *Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Castello*, datata 06/07/2016, dell'importo complessivo invariato di € 1.155.000,00, rispetto a quanto complessivamente assentito con il D.A. di finanziamento, secondo il seguente quadro economico:


a) Lavori			
a.1.1	Lavori a misura	€ 565.035,04	-€ 11.016,74
a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00	
a.1.3	Lavori in economia	€ 11.152,54	€ 11.152,54
<i>Ribasso d'asta complessivo (su lavori a misura e in economia)</i>		33,6465% di a.1)	-€ 193 866,96
a.2 + a.3	Costi sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso	€ 170 902,96	
Totale lavori		€ 553 223,59	€ 18 213,98
b) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b.1.1	Lavori in economia	€ 34 470,00	
b.1.2	Oneri accesso discarica	€ 15 000,00	
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
b.4	Imprevisti in arrotondamento	€ 10 366,79	-€ 18 513,32
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi con spese e procedure	€ 18 000,00	
b.6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice	€ 0,00	
b.7.1	Spese di cui all'art. 90 comma 5 del Codice	€ 0,00	
b.7.2	Spese di cui all'art. 92 comma 7 bis del Codice	€ 50 468,66	
b.7.3	Assistenza giornaliera di cui all'art. 16 comma 1 punto 7 del DPR 207/2010	€ 19 454,63	
b.7.4	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del codice	€ 14 941,81	€ 365,19
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	€ 0,00	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 2 068,08	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 3 508,89	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 5 200,00	
b.12.1	Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€ 400,00	
b.12.2	I.v.a. su: a)+b.1.1)+b.1.2)+b.3)+b.4)+b.6)+b.7.1)+b.7.2)+b.10)+b.11)	22,0%	€ 147 892,35 -€ 65,85
Totale somme a disposizione		€ 327 869,26	-€ 18 213,98
c) Economie a seguito ribasso d'asta			
c.1	Ribasso d'asta	€ 193 821,26	
	I.v.a. su: c.1)	21,0%	€ 40 702,46
Totale economie a seguito ribasso d'asta		€ 234 523,72	
d) Altre economie			
d.1	Economie su lavori	€ 0,00	
d.2	Economie su somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 45 481,48	
Totale altre economie		€ 45 481,48	
TOTALE a) + b) + c) + d)		€ 1 155 000,00	

costituita dai seguenti allegati:

1. Relazione
 2. Computo metrico estimativo
 3. Quadro comparativo
 4. Schema atto di sottomissione
- trasmettere copia della perizia suppletiva e di variante in oggetto, unitamente al parere tecnico di approvazione del RUP ed a copia conforme della presente deliberazione, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per gli aspetti di competenza relativi alla rendicontazione complessiva dell'intervento;
 - autorizzare il Direttore Generale dell'Ente ad adottare tutti gli atti consequenziali.

---oooOooo---

Geom. S. Nicastro

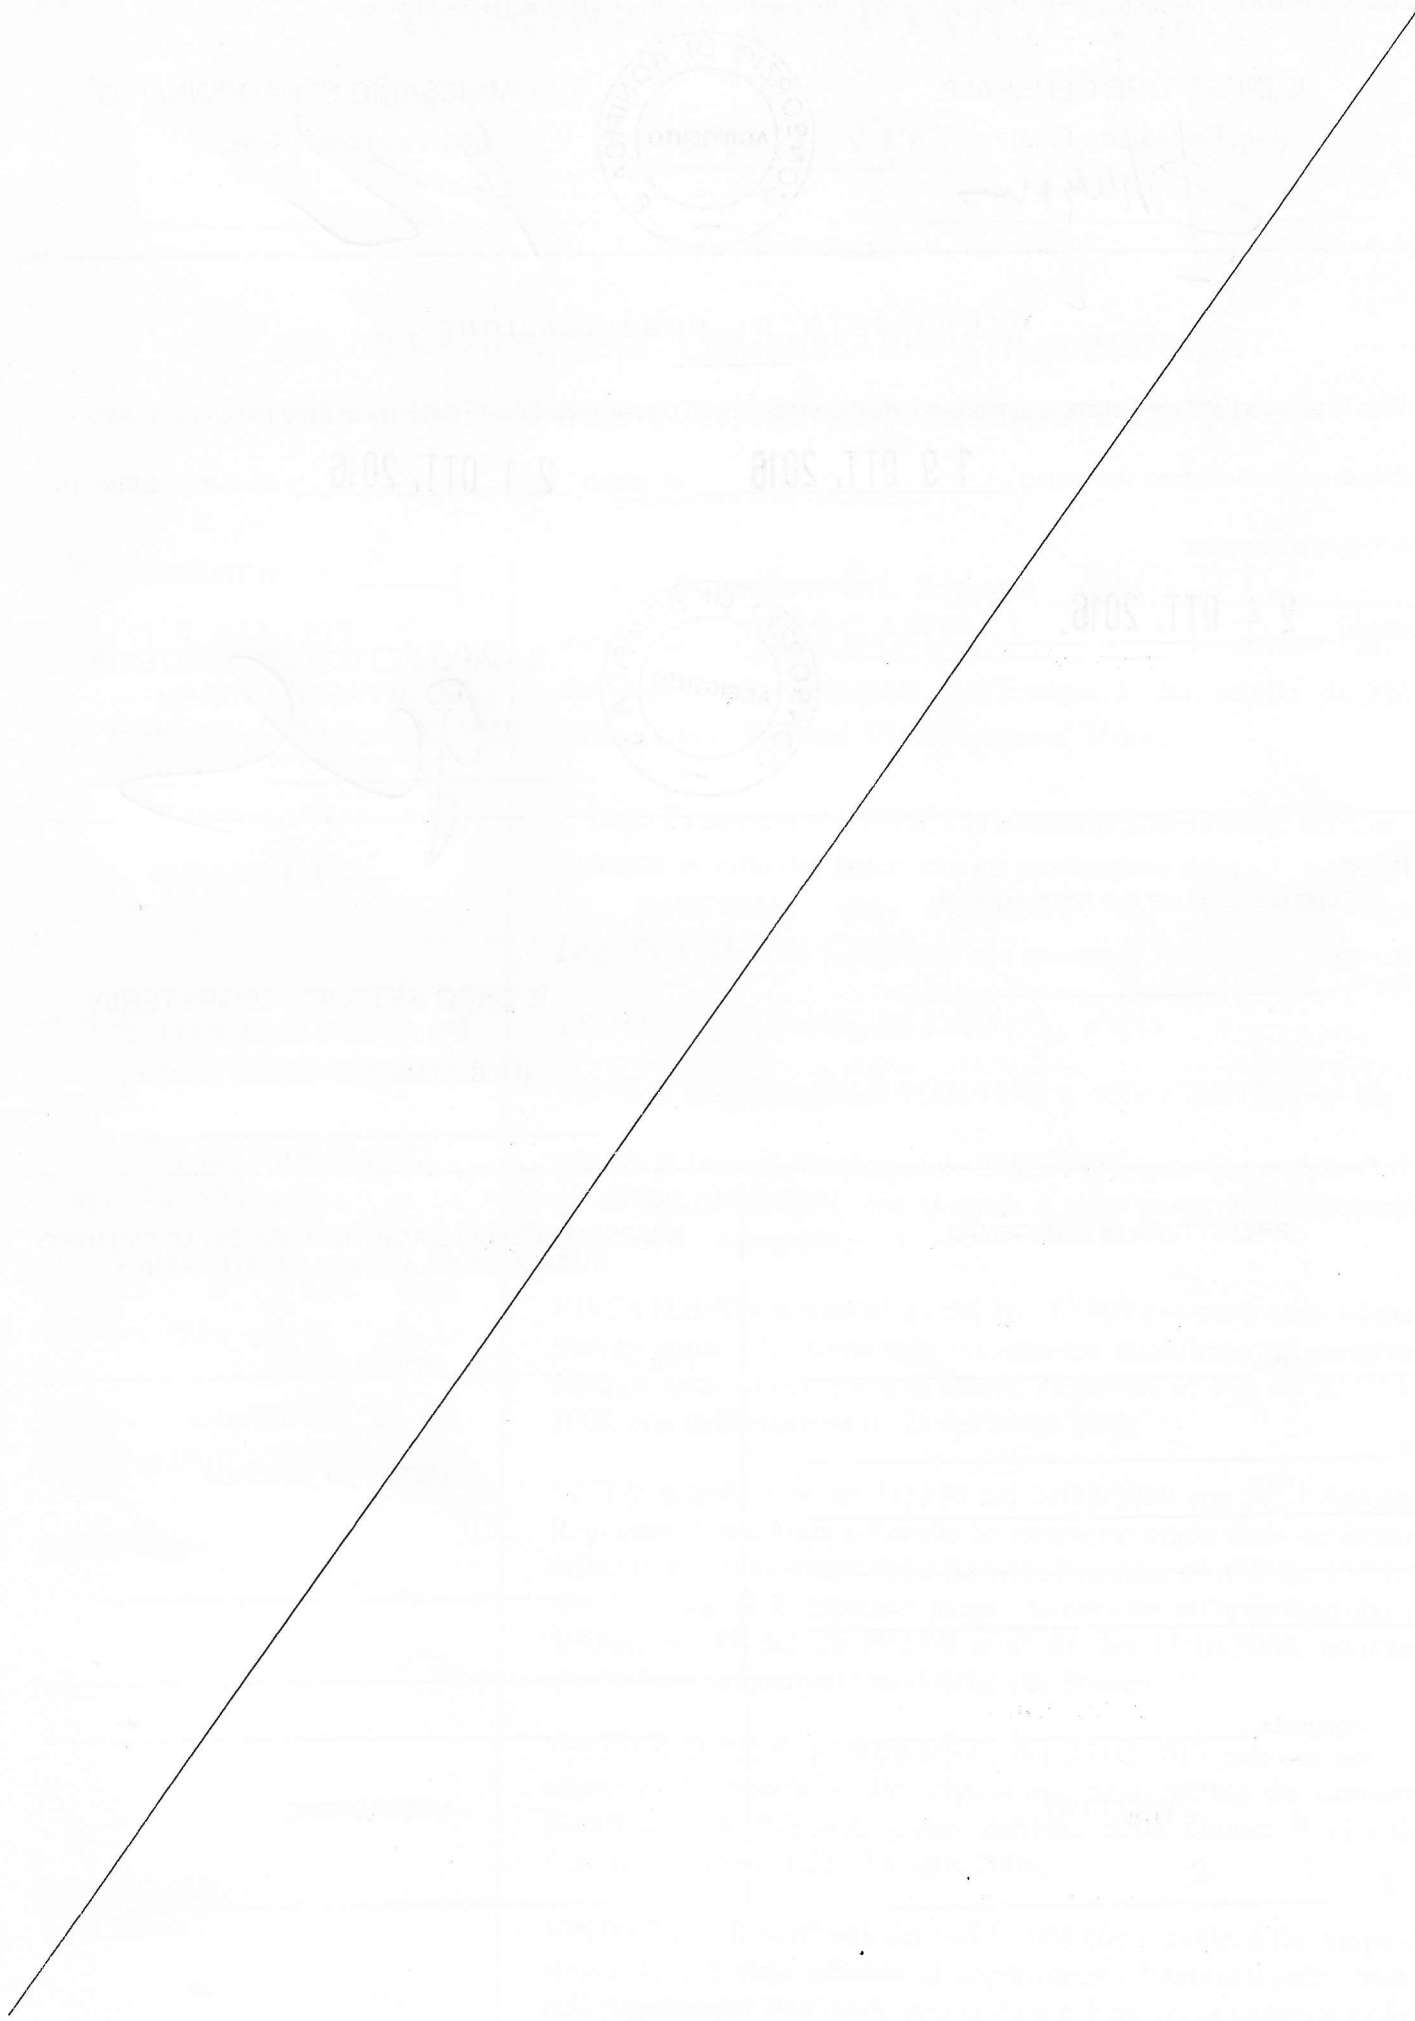

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso:

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Francesco Greco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 19 OTT, 2016 al giorno 21 OTT, 2016 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

Agrigento, 24 OTT, 2016



IL CAPO SETTORE SEGRETARIA
ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, _____

IL CAPO SETTORE SEGRETARIA
ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

N° _____ del _____

Visto _____

Agrigento, _____

IL PREFETTO

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n° _____ del _____

VISTO: SI RATIFICA

L'ASSESSORE
